

Komuniciranje projekta LIFE na območju Dobrava in Jovsi

Andrej Hudoklin

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto

Marec, 2007





PROJEKTA LIFE:

**Natura 2000 v Sloveniji –
upravljalni modeli in informacijski sistem**

Čas trajanja: 1.1. 2005 do 31.12. 2007



Akcije v okviru projekta


Natura 2000 v Sloveniji – upravljalni modeli in informacijski sistem

NA DRŽAVNEM NIVOJU


- Izdelava smernic za upravljanje območji Natura 2000
- Izdelava informacijskega sistema o Naturi 2000
- Postavitev internetne strani
- Priprava podatkovne baze
- Naravovarstveno ozaveščanje

KONKRETNE AKCIJE NA IZBRANIH OBMOČJIH
5 testnih primerov



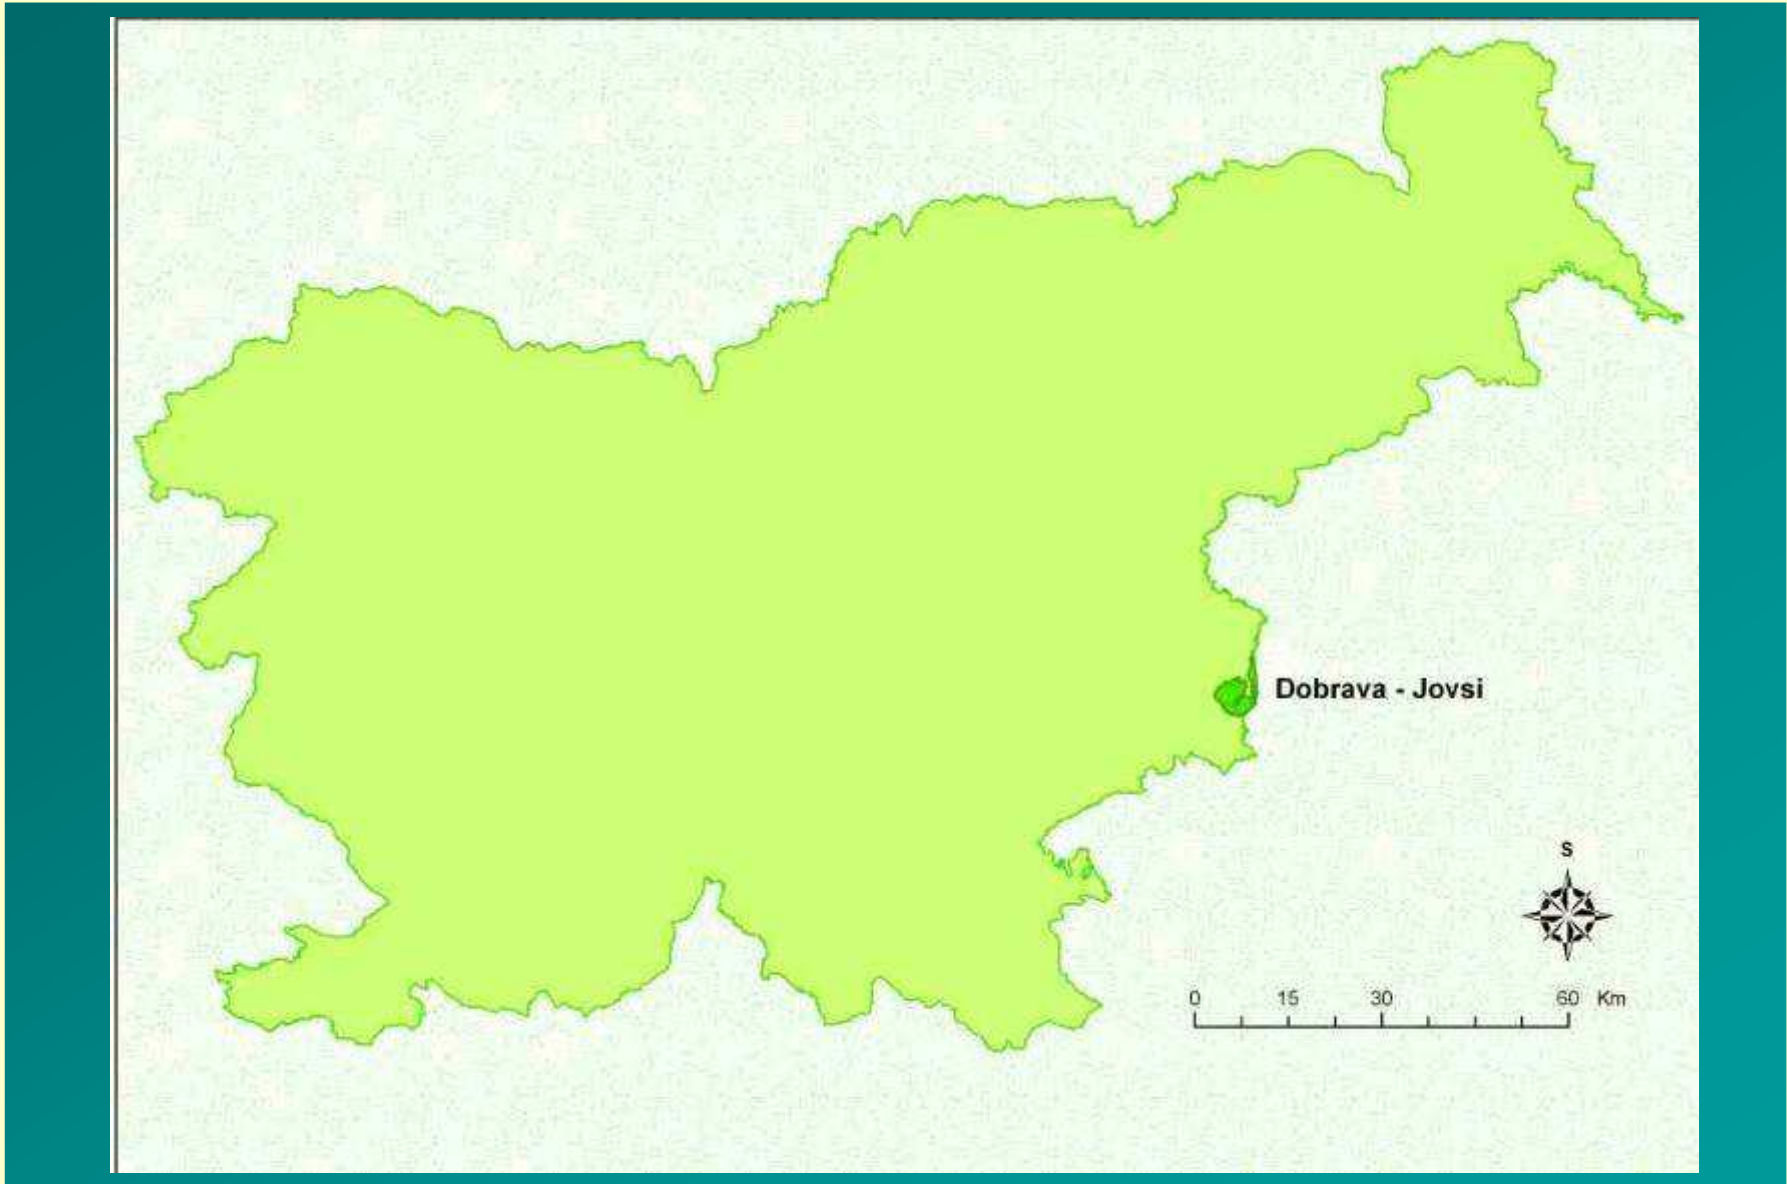

pSCI Dobrava - Jovsi

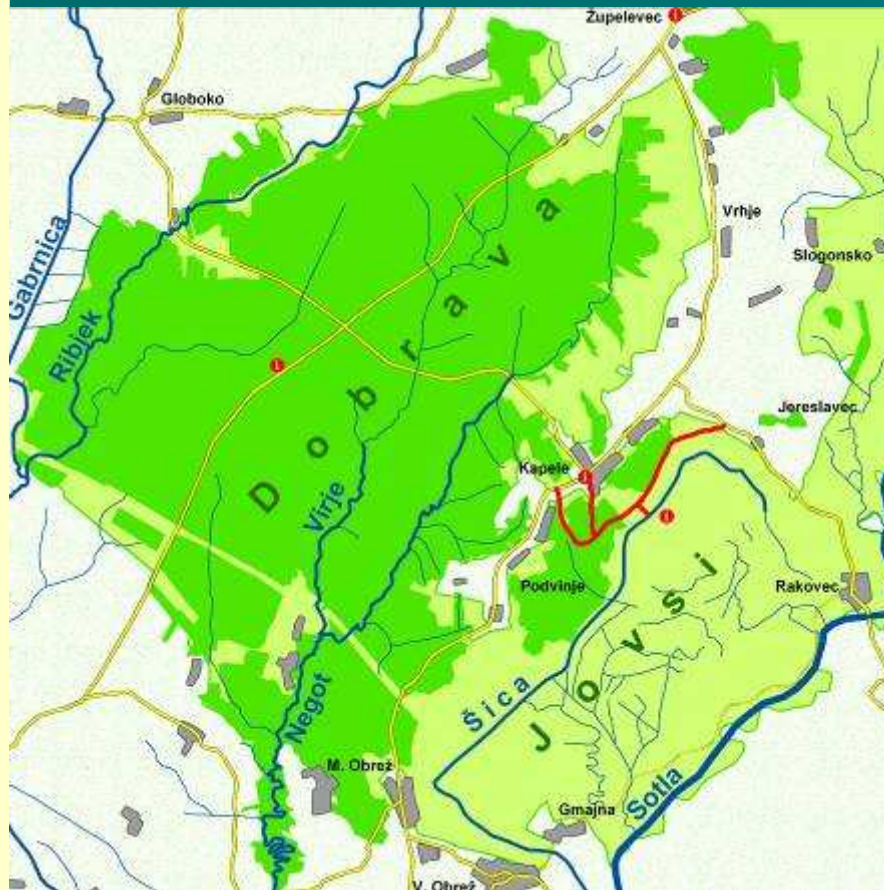

2900 ha



Zavod Republike Slovenije za varstvo narave



Projektne aktivnosti na pilotnem območju:

1. izdelava načrta upravljanja območja
2. vzpostavitev omrežja ekocelic v Dobravi
3. vzdrževanje travnikov v Jovsih
4. izboljšanje hidroloških razmer
5. postavitev opazovalnega stolpa v Jovsih
6. ureditev informacijske sobe v Kapelah
7. postavitev označevalnih in informativnih tabel





Projektne aktivnosti na pilotnem območju:

1. izdelava načrta upravljanja območja
2. vzpostavitev omrežja ekocelic v Dobravi
3. vzdrževanje travnikov v Jovsih
4. izboljšanje hidroloških razmer
5. postavitev opazovalnega stolpa v Jovsih
6. ureditev informacijske sobe v Kapelah
7. postavitev označevalnih in informativnih tabel


Izvedba odvisna od kooperativnosti lastnikov zemljišč!




Cilji načrta komunikacije

1	neposredno in posredno komunicirati s ključnimi deležniki - lastniki zemljišč
2	povečati sprejemljivost projekta LIFE
3	pridobiti lastnike za izpeljavo akcij projekta



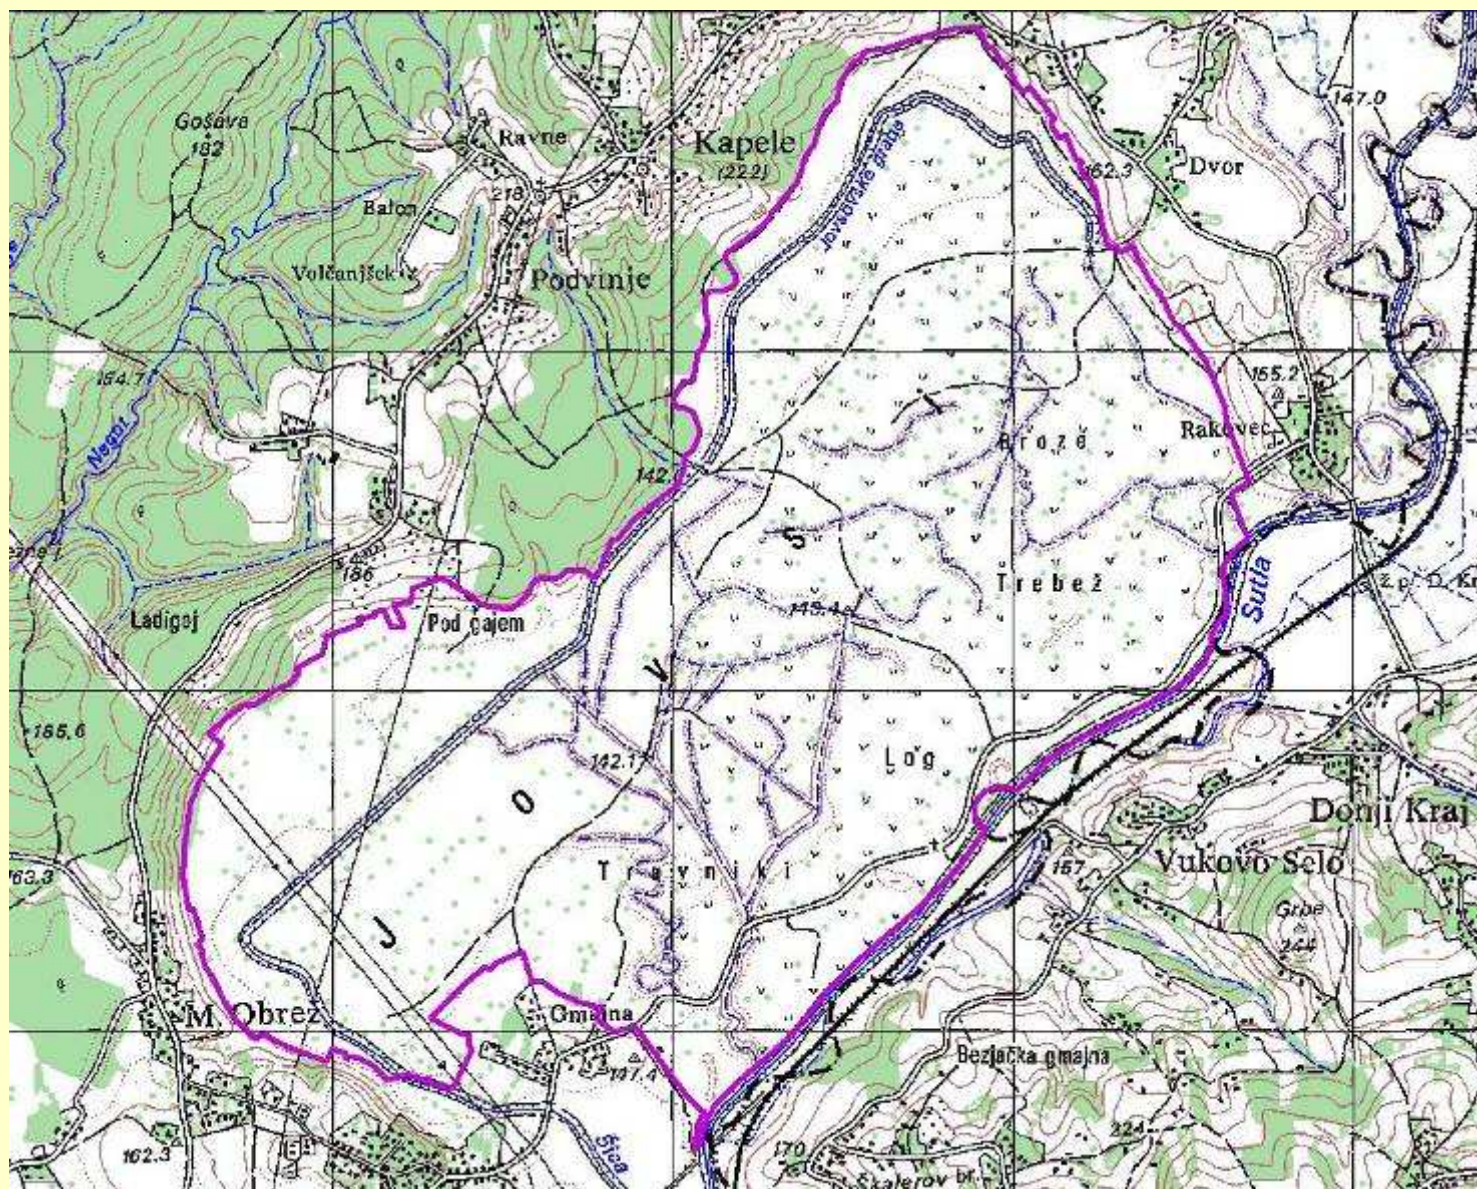

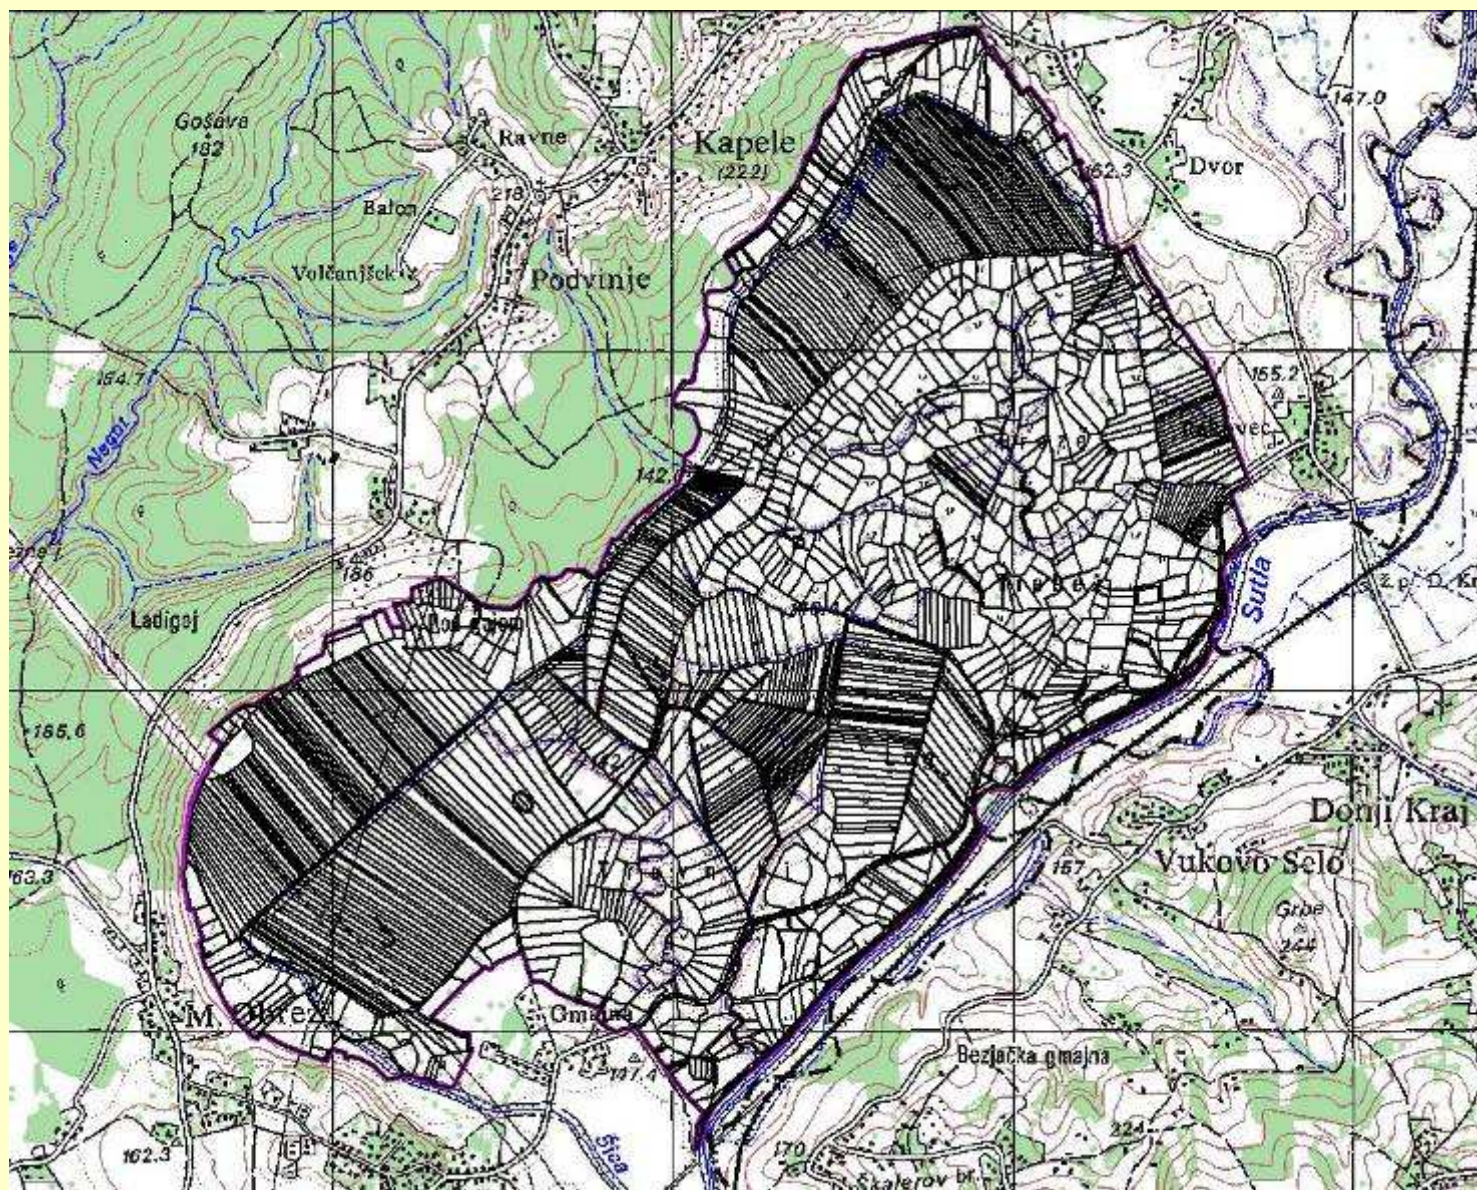

Komunikacijske ovire

- velika parcelna razdrobljenost: 1585 parcel
- veliko število lastnikov: 647
- več kot polovica parcel ima 2 ali več lastnikov (tudi 47)
- število aktivnih kmetij je v upadanju
- večina aktivnih kmetij ima najeta zemljišča
- prisoten trend opuščanja in zaraščanja travnikov
- starostna struktura lastnikov v poprečju nad 55 let
- nizka stopnja informiranosti o varstva narave



Ciljne skupine komunikacije in njihov pomen

RANG	DELEŽNIK	VRSTA DELEŽA	POMEN
1	lastniki zemljišč	izvajanje projekta – vzdrževanje zemljišč	ključen
2	KS Kapele, KS Dobova (svet, predsednik, tajnik)	pomoč pri organizaciji in izvajanju ozaveščanja	velik
3	strokovne službe: ZGS OE Brežice, KGZS KGZ Novo mesto	strokovna pomoč pri načrtovanju in izvajanju ozaveščanja	velik
4	Turistično društvo Kapele, Lovska družina Kapele, Osnovna šola Kapele	pomoč pri ozaveščanju	srednji
5	mediji	obveščanje in kreiranje javnega mnenja	srednji



Splošno informiranje deležnikov : januar – marec 2005

Deležnik	Aktivnost
Predsednik KS Kapele	predstavitev projekta in skupnih akcij
Svet KS Kapele	predstavitev projekta na seji sveta
ZGS OE Brežice	predstavitev projekta dogovor o akcije zakupa ekocelic
KGZS KGZ Novo mesto	predstavitev projekta dogovor o sodelovanju pri akcijah
lokalni mediji	Dolenjski list, Posavski obzornik, Radio Slovenija, Radio Brežice
predstavniki društev predstavniki strank mnenjski voditelji v KS Kapele	javna predstavitev v Kapelah
lastniki zemljišč v Jovsih	javna predstavitev v Kapelah
lastniki zemljišč v Jovsih	informativni list o projektu razdeljen po gospodinjstvih





Zavod Republike Slovenije za varstvo narave



**Izvedba komunikacije za akcijo
VZDRŽEVANJE TRAVNIKOV V JOVSIH**

**Cilj: pozna košnja (po 15. juliju) na 100 ha travnikov
pridobiti lastnike za podpis pogodbe
subvencija za 1 ha = 45.000 sit**





prepelica



črnočeli
srakoper



močvirski cekinček



kosec






Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

koraki	aktivnost pri izvajanju akcije	čas
1	izdelava seznama lastnikov (pribl. 400)	februar 2005
2	izdelava animacijske zloženke	marec 2005
3	izdelava osebnih vabil za delavnice	marec 2005
4	izvedba 11 delavnic (ZRSVN - KGZS) udeležba 100 lastnikov = 25% vabljenih	april 2005
5	podpisovanje pogodb 69 pogodb (lastnikov) = 102,9 ha	sept. - nov. 2005
6	izvedba pozne košnje = 98%	avgust 2006
7	nadzor in izplačilo pogodb	oktober 2006





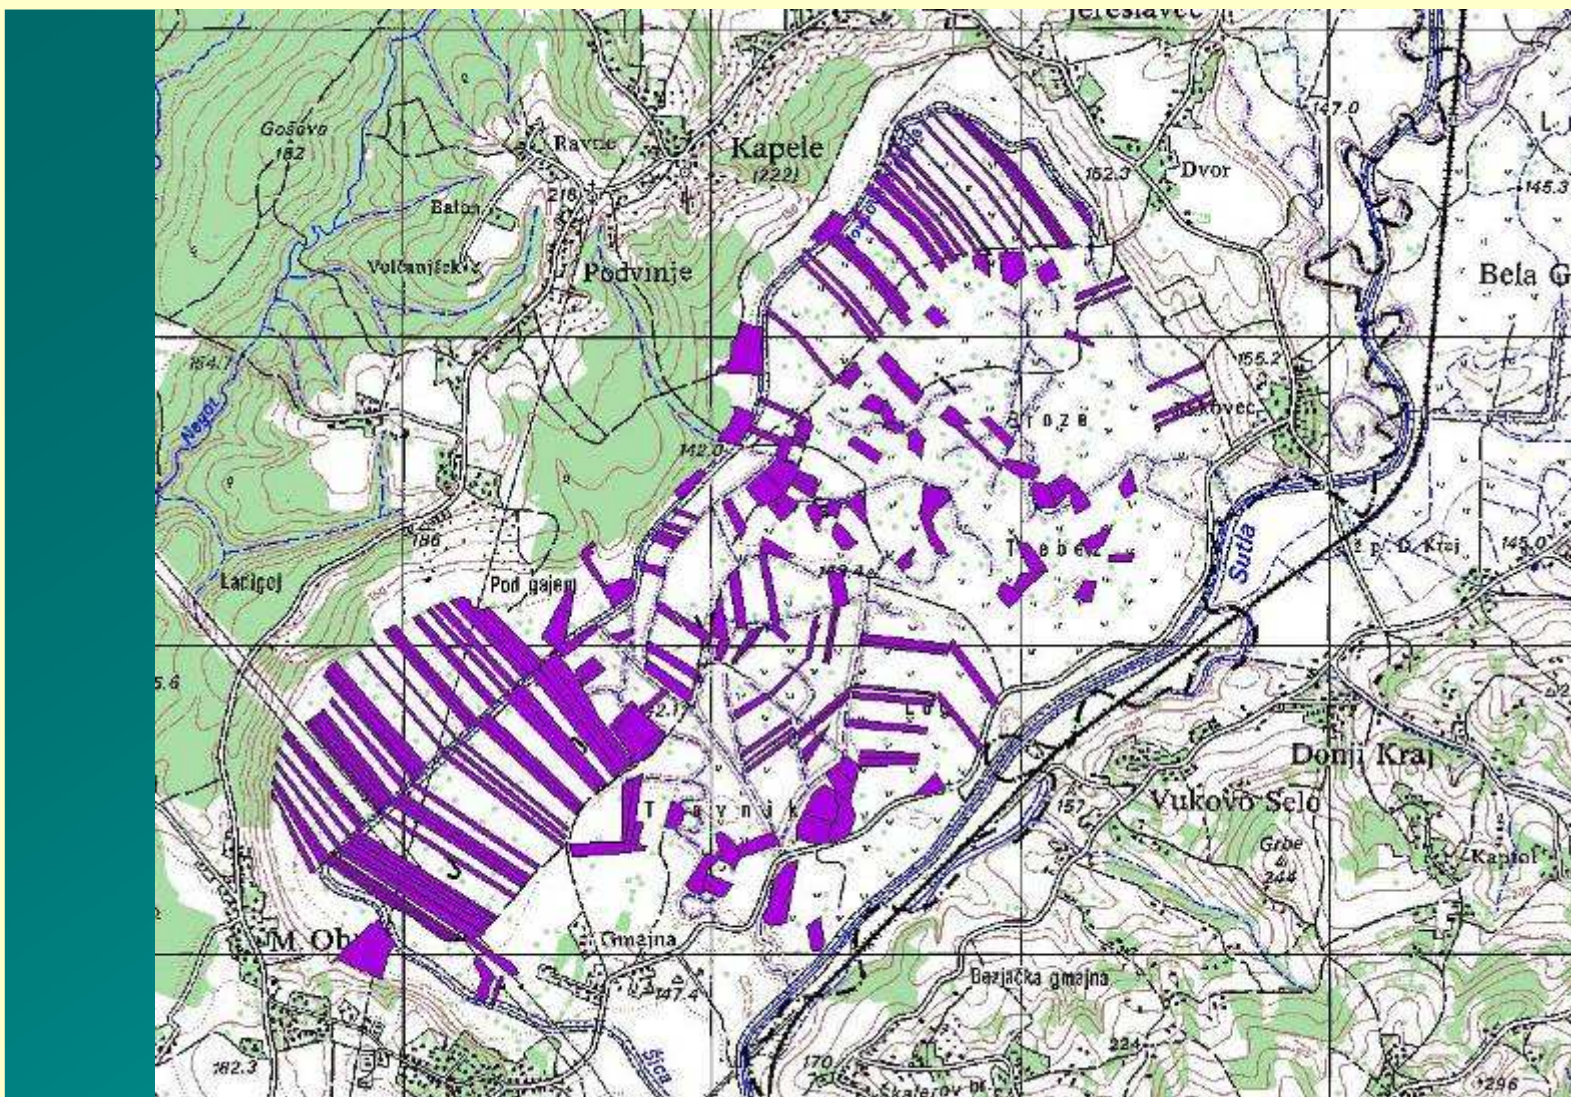

Podpisane pogodbe za pozno košnja 102,9 ha travnikov



Zavod Republike Slovenije za varstvo narave



Izvedba akcije IZBOLJŠANJE HIDROLOŠKIH RAZMER

Cilj: 1. izvesti čiščenje Šice, Jovsovske grabe, razbremenilnika

2. pridobiti soglasje 350 lastnikov = 458parcel



koraki	aktivnost	čas
1	izdelava seznama lastnikov	februar 2006
2	izdelava predstavitvenega lista akcije	marec 2006
3	izdelava osebnih vabil za predstavitve	marec 2006
4	2 javni predstavitvi: Dobova, Kapele podpisovanje soglasij (60 kom)	marec 2006
5	dopis lastnikom s priloženim soglasji pridobljenih minimalno soglasij	april - avgust 2006
6	individualni obisk 250 lastnikov (študenti)	september 2006





Rezultat:

pridobili 450 soglasij (98%) – izvedba projekta se je iztekla



Zavod Republike Slovenije za varstvo narave



Mulčenje: 62,9 ha zaraslih travnikov = 110 lastnikov



Zavod Republike Slovenije za varstvo narave



Obrezovanje 210 glavatih vrb – 75 lastnikov



Zavod Republike Slovenije za varstvo narave



Postavitev ornitološke opazovalnice



Zavod Republike Slovenije za varstvo narave



Ureditev informacijske sobe



Zavod Republike Slovenije za varstvo narave



Postavitev informativnih tabel





Ključ uspešnega dela:
najti pot do direktnega stika z lastniki

